

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

Entre los suscritos, por una parte, (i) **FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL**, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382, quien en su calidad de Suplente del Presidente, obra en nombre y representación de **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública 545 del 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaría Décima del Círculo de Cali, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA**, conformado por **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, y **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** denominado **FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE**, identificado con el NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** (el “MEN”) y el **CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y, por otra parte, (ii) **MAURICIO JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 79.779.860 de Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de **PAYC S.A.S.**, Sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública Número 17 del 14 de agosto de 1980, de la Notaría 24 de Bogotá, identificada con NIT 860.077.099-1 (el “Contratista de Interventoría Cesionario” o “EL CONTRATISTA”); de tal manera que conjuntamente serán tratados como las “Partes” e individualmente como la “Parte”, hemos convenido suscribir el presente Otrosí No. 10 al Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 celebrado el 15 de julio de 2016 (el “Contrato Marco”), de acuerdo con el clausulado acordado, y conforme las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

1. El 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “PNIE”) para la implementación de la jornada única escolar.
2. Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), como una “...cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría asociados a tales proyectos”.
3. El MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia No. 1380 del 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (el “Patrimonio Autónomo”), cuyo objeto es “*administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015*”.
4. El 15 de julio de 2016 fue suscrito el Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 entre el Consorcio FFIE Alianza BBVA, actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo, y el Consorcio Sedes Educativas.

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

5. De acuerdo con la Cláusula Primera del Contrato Marco de Interventoría, el objeto del mismo es *"realizar y ejecutar la **INTERVENTORÍA DE OBRA** a los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA-FFIE, en desarrollo del PNIE, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los TCC y en sus Adendas, y en los Anexos del presente Contrato"*.
6. De acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato Marco de Interventoría *"El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo (...)."*
7. De acuerdo con la Cláusula Tercera del Contrato Marco de Interventoría, el valor total será hasta la suma de VEINTITRÉS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$23.000.000.000).
8. De acuerdo con la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Marco de Interventoría *"Constituyen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Propuesta presentada por el Contratista, b) Los Términos de Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos, c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes, d) El Manual Operativo del PA-FFIE, e) Manual de Supervisión e Interventoría del PA FFIE.*
9. De acuerdo con el Otrosí No. 1 suscrito el día 5 de febrero de 2018, se modificó la Cláusula Séptima Obligaciones Generales del Contratista, incluyendo el numeral 36, por medio del cual se adicionaron las actividades de Supervisión Técnica Independiente.
10. De acuerdo con el Otrosí No. 2 suscrito el día 7 de junio de 2018, se modificó la Cláusula Quinta del Contrato Marco estableciendo que: *"El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo (...)"*
11. De acuerdo con el Otrosí No. 3 suscrito el día 16 de julio de 2019, se modificó la Cláusula Quinta del Contrato Marco estableciendo que: *"El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de cincuenta y cuatro (54) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo (...)"*.
12. De acuerdo con el Otrosí No. 4 suscrito el día 8 de noviembre de 2019, se modificó el literal c) del numeral 2 de la Cláusula Décima Sexta (Causales de terminación) del Contrato Marco.
13. El 25 de febrero de 2021, entre el Consorcio Sedes Educativas (el "Contratista de Interventoría Cedente") y PAYC S.A.S., (el "Contratista de Interventoría Cesionario") suscribieron el Contrato de Cesión Parcial de la posición contractual en el Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 (el "Contrato de Cesión Parcial"), en el cual se contempla la cesión de la posición contractual en las siguientes Actas de Servicios:

Boyacá:

**"Vo. Bb. CONSORCIO
FFIE ALIANZA EBVA"**

2

PAYC

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	% DE EJECUCIÓN	No. DE ORDEN
BOYACÁ	Boavita	IET INTEGRADO MARISCAL SUCRE	SEDE PRINCIPAL	66,52%	406045
BOYACÁ	Chitaraque	SAN PEDRO CLAVER	SEDE URBANA MIXTA	67,48%	406014
BOYACÁ	Ciénega	IE JOSE CAYETANO VASQUEZ	SEDE CEBADAL	87,22%	406038
BOYACÁ	Garagoa	IETI NACIONAL MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA		62,67%	406030
BOYACÁ	Moniquirá	ANTONIO NARIÑO	SEDE ESCUELA JAIRO ANIBAL NIÑO	70,72%	406017
BOYACÁ	Nuevo Colón	IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA		71,91%	406018
BOYACÁ	Paipa	ARMANDO SOLANO	SEDE CENTRAL	77,28%	406019
BOYACÁ	San Luis de Gaceno	IE SAN LUIS DE GACENO		67,99%	406032
BOYACÁ	Turmequé	IET INDUSTRIAL	SEDE PRIMARIA	66,39%	406026
BOYACÁ	Tuta	IE SAN NICOLAS	SEDE SIDERURGICA	78,76%	406041
BOYACÁ	Úmbita	IE DIVINO NIÑO	SEDE PRINCIPAL	12,59%	406059
BOYACÁ	Sogamoso	IET SAN MARTIN DE TOURS	SEDE CENTRAL		406046
BOYACÁ	Tunja	IE JULIUS SIEBER	SEDE SANTA RITA	0,00%	406001
BOYACÁ	Tunja	IE NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	SEDE CENTRAL	0,00%	406058
BOYACÁ	Tunja	L.E. RURAL DEL SUR	SEDE PRINCIPAL	0,00%	406036
BOYACÁ	Pesca	IE INDALECIO VASQUEZ	SEDE GENERAL SANTANDER	42,38%	406034
BOYACÁ	Duitama	IE TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES		0,00%	406042
BOYACÁ	Duitama	INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO		32,81%	406043
BOYACÁ	Sogamoso	IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ	SEDE NUEVA	75,45%	406006
BOYACÁ	Sogamoso	IE NUESTRA SEÑORA DE MORCA	SEDE CENTRAL	0,00%	406047
BOYACÁ	Sogamoso	IE POLITECNICO ALVARO GONZALEZ SANTANA	SEDE CENTRAL BACHILLERATO	0,00%	406009
BOYACÁ	Sogamoso	IE TECNICO INDUSTRIAL GUSTAVO JIMENEZ	SEDE PRINCIPAL	73,01%	406010
BOYACÁ	Sogamoso	IE EL CRUCERO	SEDE PRINCIPAL	50,81%	406008

Santander:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	% DE EJECUCIÓN	No. DE DRDEN
SANTANDER	Floridablanca	INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	SEDE INSTITUTO CARACOLI B	48,33%	406002
SANTANDER	Piedecuesta	IE CDLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA BUENA ESPERANZA		63,02%	406056
SANTANDER	Charalá	IE NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN		68,00%	406049
SANTANDER	Cimitarra	IE INTEGRADO DEL CARARE		47,54%	406051
SANTANDER	Güepsa	IE SANTO DOMINGO SAVIO	SEDE A	31,41%	406037
SANTANDER	Málaga	IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SEDE A	62,14%	406039
SANTANDER	Puerto Wilches	IE COLEGIO INTEGRADO		30,25%	406050
SANTANDER	Sabana de Torres	IE INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO		66,87%	406052
SANTANDER	Piedecuesta	IE COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	SEDE PRINCIPAL	49,06%	406053
SANTANDER	Piedecuesta	ESCUELA NORMAL SUPERIOR		39,38%	406055

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

SANTANDER	Bucaramanga	IE RURAL BOSCONIA	SEDE B SANTA RITA	0,00%	406062
SANTANDER	Bucaramanga	IE CAMACHO CARREÑO	SEDE A	12,90%	406044
SANTANDER	Oiba	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	SEDE PRINCIPAL	0,00%	406063
SANTANDER	Floridablanca	COLEGIO TÉCNICO VICENTE AZUERO	SEDE A	45,61%	406004
SANTANDER	Piedecuesta	IE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL SUR	SEDE B	61,57%	406065
SANTANDER	Piedecuesta	IE COLEGIO GABRIELA MISTRAL	SEDE PRINCIPAL	40,55%	406064
SANTANDER	Piedecuesta	IE VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	SEDE A	0,00%	406057

14. Mediante Comité Fiduciario del PA – FFIE en sesión No. 409 del 26 y 27 de febrero de 2021, se autorizó la cesión parcial de la posición contractual en las Actas de Servicios (las "Actas de Servicios Ceditas") relacionadas en el Contrato de Cesión Parcial a favor del Contratista de Interventoría Cesionario.
15. De acuerdo con el Otrosí No. 5 suscrito el día 27 de febrero de 2021, el Contratante reconoció los costos derivados de la implementación del protocolo de bioseguridad y del PAPSO y el costo mensual del personal de interventoría.
16. El 1 de marzo de 2021, el Contratante envió comunicación, al Contratista de Interventoría Cedente y al Contratista de Interventoría Cesionario por medio de la cual informó que el Comité Fiduciario autorizó la cesión parcial de la posición contractual de las Actas de Servicios relacionadas en el Contrato de Cesión Parcial a favor del Contratista de Interventoría Cesionario y aprobó el Contrato de Cesión Parcial.
17. Además, señaló que el Contratista de Interventoría Cesionario recibiría las Actas de Servicios Ceditas conforme con todas y cada una de las condiciones contractuales en ellas contenidas, respecto de las cuales constituirá las correspondientes pólizas y, recordó al Contratista de Interventoría Cedente que deberá actualizar las pólizas que amparan los riesgos derivados del Contrato Marco en lo relacionado con las Actas de Servicios que no son objeto del Contrato de Cesión Parcial.
18. Por otra parte, el Comité Técnico en sesión No. 445 del 23 de febrero de 2021 presentó recomendación ante el Comité Fiduciario, el cual en sesión No. 409 del 26 de febrero de 2021, aprobó la prórroga al Contrato Marco, en razón de la ampliación del plazo de ejecución, adicionando el valor del costo fijo en un total de \$792.857.875, considerando una proyección del IPC del 1.6% para 2021, y del 3% para 2022 y autorizando un valor asumido 100% por el FFIE con recursos de contingencia, de la siguiente manera:

	Valor estimado costo fijo	Total meses por año	Total Valor
COSTO FIJO MENSUAL 2021 (IPC - 1.60%)	\$ 71.881.947	10	\$ 718.819.470
COSTO FIJO MENSUAL 2022 (IPC ESTIMADO 3%)	\$ 74.038.405	1	\$ 74.038.405
		11	\$ 792.857.875

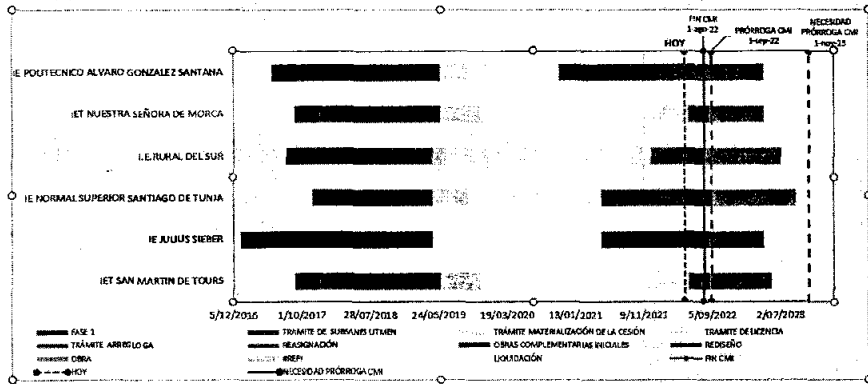
19. De acuerdo con el Otrosí No. 6 suscrito el día 1 de marzo de 2021, se modificó la Cláusula Quinta del Contrato Marco estableciendo que: "El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de sesenta y cinco (65) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo,

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

(...)", y se adicionó el costo fijo por un valor mensual de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$71.881.947) MONEDA LEGAL CTE** de conformidad con lo definido en los TCC. Dicha adición fue realizada considerando el IPC del año inmediatamente anterior del 1,60%. Para los años siguientes se realizará la adición correspondiente al costo fijo, de conformidad con el procedimiento definido en los TCC.

20. De acuerdo con el Otrosí No. 7 suscrito el día 29 de junio de 2021, se aclaró el valor total del costo fijo en la suma de **SETECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$790.701.417) MONEDA LEGAL C/TE** y se pactó la metodología para pagos mensuales al Contratista de Interventoría proporcionales a las fechas de finalización de la Fase 2 de los Acuerdos de Obra.
21. De acuerdo con el Otrosí No. 8 suscrito el día 29 de octubre de 2021, las partes acordaron incluir unas obligaciones precisas a cargo del Contratista, para efectos de identificar y cuantificar las obras que fueron ejecutadas y no concluidas como hito por parte del Contratista GMP INGENIEROS S.A.S., pactando el reconocimiento económico al cual tendrá derecho el Contratista por las visitas realizadas.
22. Teniendo en cuenta el acuerdo de voluntades aprobado en el comité fiduciario No. 490 del 23 de noviembre de 2021, con el Contratista de Obra, Consorcio Boyacá G19 correspondiente al Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016, se estableció la necesidad de contar con el plazo suficiente para la culminación de la ejecución de obras de las Instituciones Educativas, de acuerdo con los compromisos pactados dentro del acuerdo aprobado el 23 de noviembre de 2021.
23. Por lo anterior, de acuerdo con el Otrosí No. 9 suscrito el día 20 de diciembre de 2021, fue modificada la Cláusula Quinta del Contrato Marco estableciendo que: *"El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de setenta y un (71) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo (...)"*, y fue adicionado el costo fijo por un valor mensual de **SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$74.469.698) MONEDA LEGAL CTE** de conformidad con lo definido en los TCC. Dicha adición fue realizada considerando la proyección del IPC 3,6% para el año 2022. Por lo que el valor total que fue adicionado al costo fijo correspondió a la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (\$446. 818.188)**. Para los años siguientes se realizará la adición correspondiente al costo fijo, de conformidad con el procedimiento definido en los TCC.
24. El Contratista de Interventoría Cesionario mediante comunicación No. PEJ-043322 del 10 de mayo de 2022, solicitó una prórroga de un (1) mes, es decir, hasta el 1 de septiembre de 2022, con el fin de contar con el plazo suficiente para la ejecución de obras complementarias previas al inicio de la Fase 2 de la Institución Educativa Julius Sieber - Sede Santa Rita, obras complementarias que serán ejecutadas por el contratista de obra en un término de 103 días calendario, sin perjuicio de que pueda ser necesario una prórroga mayor para la ejecución de la totalidad de Acuerdos de Obra en ejecución, tal y como se explican en el diagrama que viene a continuación, y que en cualquier caso, requerirá de un acuerdo previo entre el Contratista de Interventoría Cesionario y EL CONTRATANTE:

OTOSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.



Nota: Se estima la necesidad de una prórroga al contrato marco total por 15 meses, sin embargo, se encuentra en estudio de la viabilidad de la continuidad de la interventoría para la ejecución de actividades de las Fases 2 de los proyectos en mención.

25. Respecto los seis (6) de los proyectos que integran el Contrato Marco, y que se enuncian en el diagrama incluido en el numeral anterior, en los cuales está pendiente por iniciar la Fase 2 de los Acuerdos de Obra, puede ocurrir que el inicio de esa Fase 2 se dé durante el término de prórroga del plazo del Contrato Marco que las Partes acuerdan mediante el presente Otrosí. En cualquier caso, si la ejecución de la Fase 2 y 3 de los Acuerdo de Obra, de los seis (6) proyectos a los que se ha hecho referencia, se extiende con posterioridad al nuevo plazo del Contrato Marco, el Contratista de Interventoría Cesionario y EL CONTRATANTE deberán suscribir el Otrosí correspondiente.

26. A la fecha, el tiempo que resta para la finalización del plazo Contrato Marco es de menos de tres (3) meses.

27. Por lo anterior, es necesario prorrogar el Contrato Marco, con el fin de que el Contratista de Interventoría Cesionario, continúe desempeñando sus funciones, respecto de las obras complementarias previas, al inicio de la Fase 2, de la Institución Educativa Julius Sieber - Sede Santa Rita, dado que la finalización de las obras se tiene prevista en una fecha que excede la del plazo de terminación actual del Contrato Marco, esto es, el 1º de agosto de 2022.

28. En razón a que se debe ampliar el plazo de ejecución del Contrato Marco de Interventoría, es necesario ampliar el valor del costo fijo, el cual deberá EL CONTRATANTE asumir por cuentas de contingencias.

29. Con base en lo anterior el contratista de interventoría cesionario informó al PA-FFIE a través de comunicación COM-0549-22 del 26 de mayo de 2022, que mediante boletín técnico del 5 de enero de 2022, el DANE registró una variación anual del IPC durante el año 2021, en un 5,62%, por lo que se hace necesario actualizar el valor del costo fijo de Interventoría para el año 2022. Es así como, el valor del costo fijo mensual de Interventoría para el año 2022 equivale a SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$75.921.713) Mcte.

30. En tal sentido, las condiciones finales para el Contrato Marco de Interventoría, con las modificaciones antes expuestas, son las siguientes:

	Descripción	Contrato Marco de Interventoría	
		Actual	Modificación
	Suscripción	12-jul-2016	12-jul-2016

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

Inicio	27-jul-2016	27-jul-2016
Terminación	1-ago-22	1-sept-22
Plazo	71 meses	72 meses

31. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil NO 1380 suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actúa única y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; así mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Así mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuración de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión del FFIE, así como la supervisión e interventoría de las obras, está en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario selecciones, de acuerdo con la recomendación del Comité Técnico.

En virtud de lo anterior, la presente modificación fue presentada y aprobada en sesión No. 545 del Comité Fiduciario del 16 de mayo de 2022 y aclarada en sesión No. 561 de fecha 23 de junio de 2022, de acuerdo con la recomendación del Comité Técnico del PA-FFIE. En tal sentido, el Comité Fiduciario instruyó a ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en su calidad de representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando única y exclusivamente como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE, para suscribir el presente OTROSÍ al Contrato Marco.

II. CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Las Partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Marco por el término de un (1) mes. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA, que será aplicable únicamente respecto de la porción cedida al Contratista de Interventoría Cesionario, en los siguientes términos:

“QUINTA. TÉRMINOS Y PLAZOS: “El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de setenta y dos (72) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente Contrato. Los términos mínimos y máximos para la ejecución de las Actas de Servicios que se deriven del CONTRATO MARCO se establecerán de acuerdo con lo que para el efecto se ha considerado en relación con las fases de ejecución, descritas en los TCC, en especial según lo indicado en su numeral 9.7. y en su Anexo Técnico”.

CLÁUSULA SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar a partir del año 2022, el costo fijo por un valor mensual de **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$75.921.713) MONEDA LEGAL CTE.**, durante el mes adicional de conformidad con lo definido en los TCC. La presente adición se realiza teniendo en cuenta la variación anual del IPC registrada durante el año 2021 que corresponde al 5,62%, es decir, que el valor total del costo fijo mensual corresponde a la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$75.921.713) MONEDA LEGAL CTE.** Para los años siguientes, se realizará la adición correspondiente del costo fijo, de conformidad con el procedimiento definido en los TCC.

CLÁUSULA TERCERA. Las Partes entienden y aceptan que, como consecuencia de la ampliación del término de ejecución del Contrato Marco, en la porción cedida, el Contratista de Interventoría Cesionario constituirá las

**“Vo. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBVA”**

7
PAYC

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-53-2016 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, Y PAYC S.A.S.

garantías en cumplimiento de lo dispuesto en los TCC, Anexo Técnico y demás documentos contractuales del Contrato Marco y con fundamento en el Contrato de Cesión Parcial aprobado por el Contratante.

PARÁGRAFO. El Contratista de Interventoría Cesionario deberá presentar las garantías para aprobación del Contratante, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del presente Otrosí. Para estos efectos, el Contratista de Interventoría Cesionario deberá constituir las garantías de conformidad con los términos establecidos en el Contrato Marco, sus Anexos y los TCC, y se surtirá el mismo procedimiento establecido para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del Contrato Marco.

CLAUSULA CUARTA. Las Partes entienden y aceptan, que la remuneración mensual del costo fijo, establecida en el numeral 9.8.1 de los TCC, así como el Costo Variable, establecido en el numeral 9.8.2 de los TCC, se reconocerá durante el nuevo término previsto para la ejecución del Contrato Marco, sin que ello modifique el Valor del Contrato Marco establecido en la Cláusula Segunda.

CLÁUSULA QUINTA. Las Partes dejan expresa constancia que los efectos del presente Otrosí sólo se circunscribirán a lo aquí expresamente pactado y, que las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato Marco, incluyendo aquellas del Anexo Técnico de los TCC, de los TCC y de los demás documentos que hacen parte integral del Contrato Marco, se mantienen inalteradas.


PARÁGRAFO PRIMERO. El Contratista de Interventoría Cesionario se reserva la facultad de efectuar futuras reclamaciones, especialmente, en lo concerniente a los costos de personal variable por tiempos adicionales derivados de la prórroga del plazo del Contrato Marco y/o Actas de Servicios y Contrato Marco de Obra y/o de los Acuerdos de Obra, por causas no imputables a la interventoría.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Por su parte el Contratante, manifiesta que la firma de este documento no implica la aceptación de las reclamaciones que pueda presentar a futuro el Contratista de Interventoría Cesionario, las cuales serán objeto de análisis.


CLÁUSULA SEXTA. El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia se firma por las Partes en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2022, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

EL CONTRATANTE


FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER
SABOGAL
C.C No. 93.389.382
Representante Legal
Alianza Fiduciaria S.A. – Representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien actúa

EL CONTRATISTA,


MAURICIO JOSÉ PÉREZ RAMÍREZ
C.C. No. 79.779.860 de Bogotá
Representante Legal
PAYC S.A.S.

única y exclusivamente como vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE
